



滝上町国民健康保険診療所建替工事 工事進捗状況の お知らせ No. 125


令和7年1月28日(火)



今日の現場

給排水衛生設備

= 2階天井裏スプリンクラー配管 =

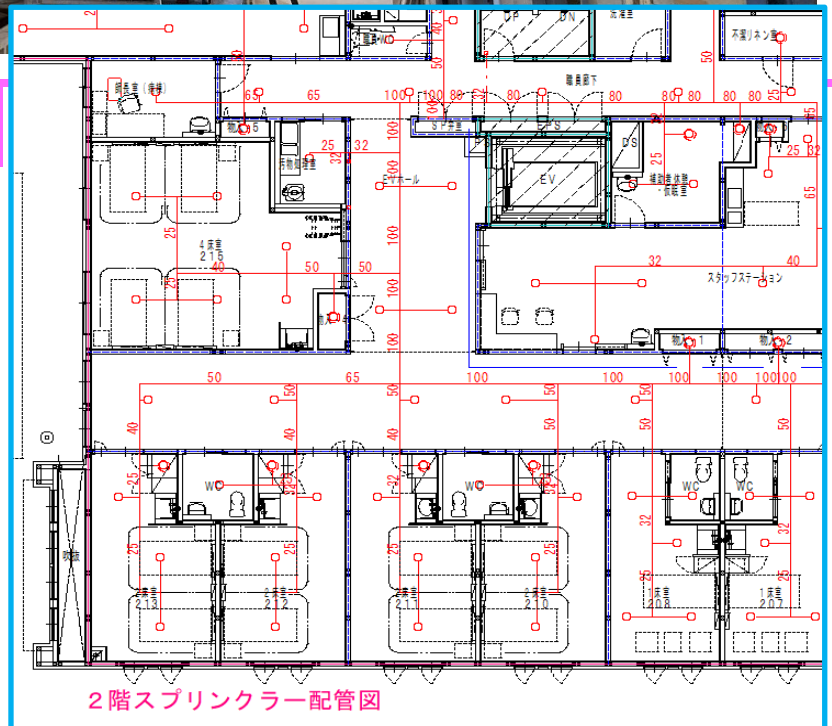

- ・ 消火設備(スプリンクラー)の配管施工が始まりました
- ・ SGP(白)管が使用されます。管径は25mmから100mm。
- ・ 総延長は1,340mとなります。
