





# 滝上町国民健康保険診療所建替工事 工事進捗状況の お知らせ No. 129 令和7年2月6日(木)



## 今日の現場

### 鉛板張り施工

= 1階レントゲン・CT室 =

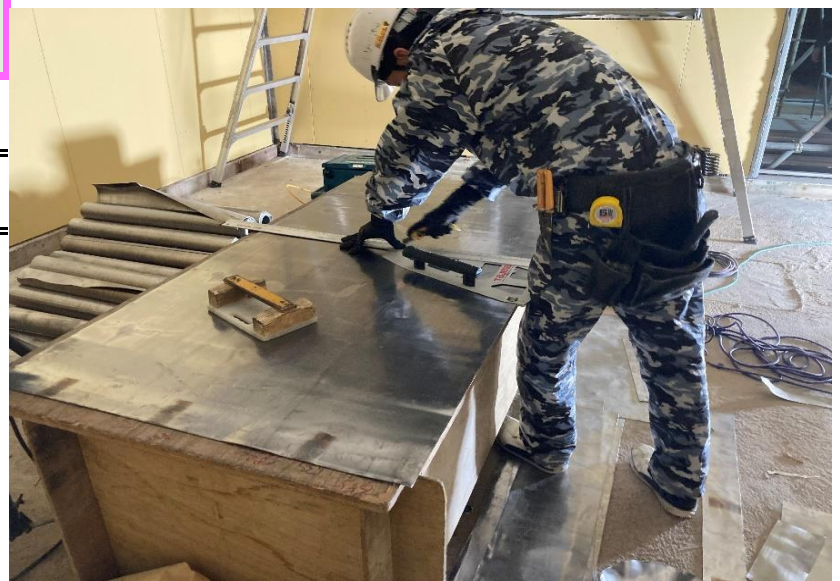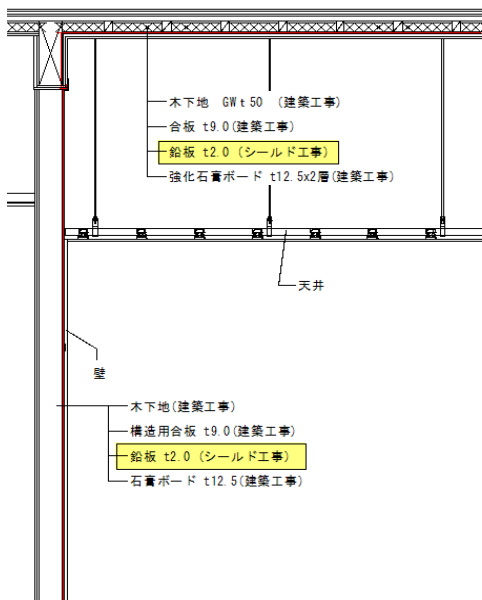

- ・鉛板を壁に貼り付ける施工が行われています。
- ・1巻き40kgの鉛板を熟練工が平らに伸ばし、決められた大きさに切断して天井と壁に貼り付けていきます。
- ・機器からの放射線を遮蔽するために施工されます
